



Město Kopřivnice

**Akční plán rozvoje města
Kopřivnice pro období
2013-2014**

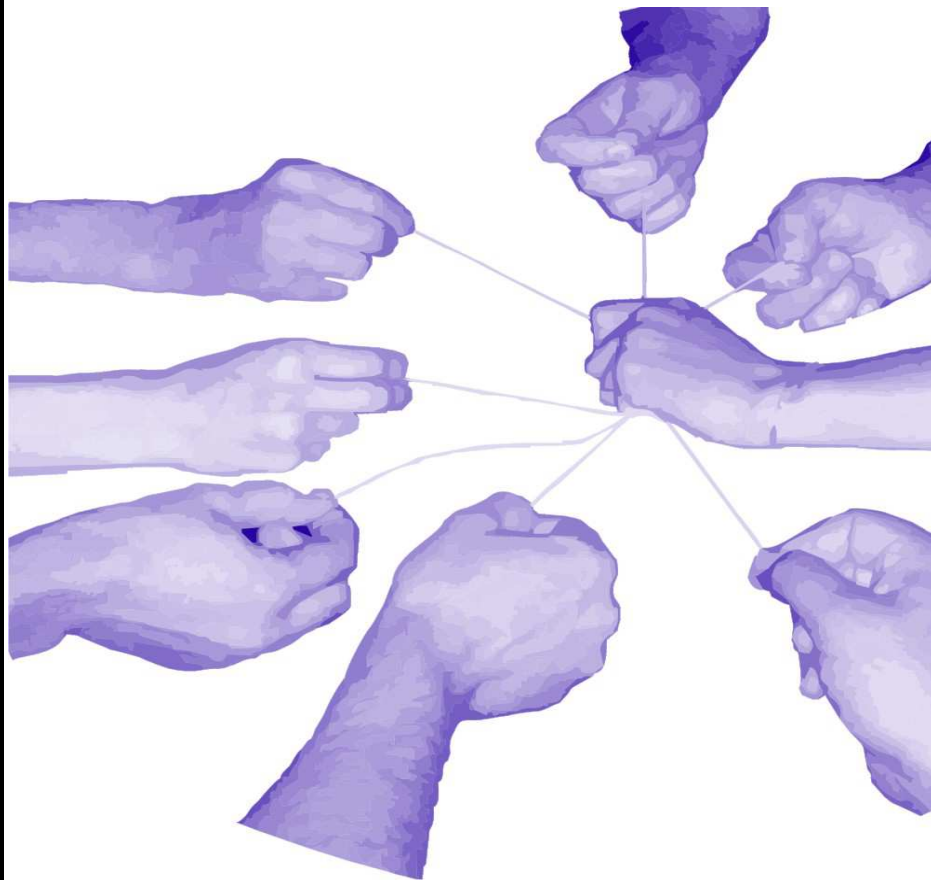

Vyhodnocení k 31.12.2013

Akční plán pro rok 2013 - 2014

E: Ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojů

Kód SP	Akce	Indikátor	Termín plnění	Odpovědnost	Stav	Komentář
1 E.1.1.2	Databáze nemovitostí / aktualizace a propagace databáze ploch a objektů k podnikání	aktuální nabídka	2013 / 2014	CPR	splněno	Informace jsou zveřejňovány na www.prokopr.cz
2 E.1.2.2	Podpora podnikatelského prostředí / zajištění porad., konz. a vzd. služeb a aktivit pro podnikatele	aktuální nabídka	2013 / 2014	ORM	splněno	Na základě smlouvy poskytuje CPR bezplatné poradenské služby začínajícím MSP. Počet zájemců o tyto služby se však trvale snižuje
3 E.1.3.1	Spolupráce s podnikateli / setkání podnikatelů a vedení města nad aktuálními problémy / projekty města	2x ročně akce	2013 / 2014	ORM	splněno	Zástupci významných zaměstnavatelů se účastní jednání RRLZ, zástupci podnikatelů jsou členy Komise pro strategický rozvoj
4 E.1.3.1	Spolupráce s podnikateli / společná propagace a prezentace města a podnikatelů	min. 2x ročně akce	2013 / 2014	OVV	splněno	Město se s podnikateli podílelo na akci Kopřivnické dny techniky,
5 E.1.3.1	Spolupráce s podnikateli / realizace farmářského trhu	min. 2x ročně akce	2013 / 2014	ORM	splněno	Byly realizovány 4 farmářské trhy
6 E.2.1.1, 3, 6, 7	RRLZ / realizace projektu (ú) celoživotního vzdělávání	min. 1 real. projekt	2013 / 2014	RRLZ	splněno	V rámci projektu 10 let s Vámi proběhla vzdělávací akce pro seniory SeniorComp (realizace Skautské centrum)
7 E.2.1.1	RRLZ / spolupráce dotčených subjektů v rámci projektu	4x ročně schůzka	2013 / 2014	OŠK	splněno	RRLZ se v sešla 4x, byla doplněna o personální manažery významných kopřivnických firem
8 E.2.1.5	Popularizace technických oborů / opakování dílčích aktivit realizovaných v rámci projektu Techno 2012	realizace akce	2013	CPR	splněno	Aktivita bude realizována ve spolupráci s CPR ve školním roce 2013/2014. Aktivity plánované pro rok 2013 se uskutečnily (Den technických řemesel)
9 E.2.1.6	Akademie III. věku / poskytování informací do MČ	roční zpráva o aktivitách	2013 / 2014	OŠK	splněno	Informace jsou do MČ poskytovány prostřednictvím klubů seniorů. Zpráva o aktivitách bude součástí výroční zprávy KDK
10 E.2.1.6	Akademie III. věku / realizace tématických večerů po dohodě se seniory v MČ	realizace akce	2013 / 2014	OSV	splněno	V rámci projektu Aktivní senior 2013 - I stárnutí může být zábava proběhly přednášky o 1. pomoci a důchodové reformě.
11 E.2.1.8	Analýza využití školských zařízení v Kopřivnici / zpracování výhledu rozvoje školství do r. 2020 vč. MŠ	usnesení RM	2013	OŠK	splněno	Materiál byl schválen RM na 68. schůzi dne 18.2.2013
12 E.2.2.1	ZŠ Náměstí / rozhodnutí o dalším využití objektu	PZ usnesení RM,ZM	2013	OŠK	zahájeno	Zahájena jednání o možném využití objektu.
13 E.2.2.2	ZŠ M. Horákové / příprava žádosti o dotaci na realizaci energetických opatření	E PZ podaná žádost	2014	ORM	splněno	Žádost o dotaci byla podána do mimořádné výzvy a následně schválena. V průběhu letních prázdnin byl projekt energetických opatření realizován.
14 E.2.2.2	ZŠ Alšova / realizace projektu Škola 21. století - zajištění spoluúčasti	E PZ předání díla	2013	OŠK	zahájeno	V roce 2013 byly realizovány stavební úpravy, v současné době probíhá nákup a instalace vybavení pořízeného v rámci projektu.
15 E.2.2.2	ZŠ E. Zátopka / energetická opatření - výměna oken	E PZ předání díla	2013	OMM	zahájeno	Město podalo žádost o dotaci na zateplení objektu včetně výměny oken, z toho důvodu nebyla výměna realizována v roce 2014.
16 E.2.2.2	Mateřské školy / vybraná MŠ PD pro přípravu žádosti o dotaci na energetická opatření	E PZ připravená PD	2013	OMM	nezahájeno	Na projektovou přípravu nebyly v roce 2013 v rozpočtu města vyčleněny finance.
17 E.2.2.5 a 6	Hřiště u ZŠ E. Zátopka / řešení oplocení a okolní zeleně	PZ předání díla	2013 / 2014	OMM	splněno	Byly odstraněny nebezpečné stromy v blízkosti školního hřiště a instalováno nové oplocení areálu.
18 E.2.2.5	Modernizace zahrad MŠ / realizace projektu Svět je velká zahrada III	PZ předání díla	2013 / 2014	OŠK	splněno	Byla dokončena revitalizace zahrad MŠ Krátká a Francouzská

Shrnutí: Akce plánované pro rok 2013 v této prioritní oblasti byly **splněny** ze **78 %** a na **17 %** akcí byly **zahájeny** práce. Finančně nejvýznamnější akcí bylo realizace energetických opatření budov ZŠ dr. M. Horákové, na které se městu podařila získat dotace z OPŽP. Rovněž ZŠ Alšova a Mateřské školy Kopřivnice realizovaly či zahájily realizaci svých projektů podpořených dotací z ROP Moravskoslezsko.

Akční plán pro rok 2013 - 2014

S: Sociální zázemí

Kód SP	Akce	Indikátor	Termín plnění	Odpovědnost	Stav	Komentář
1 S.1.1.1	Aktivity pro seniory / v příp. získání dotace pro projekt "10 let s Vámi" realizace aktivit pro seniory	realizace plán. akcí	2013	OSV	splněno	Byly realizovány všechny aktivity plánované v rámci projektu podpořeného dotací MSK.
2 S.1.1.2	Občanská poradna / podpora provozu, rozšíření provozní doby	poskytování služeb	2013 / 2014	OSV	splněno	Občanská poradna poskytuje své služby v budově MÚ, provoz je podpořen prostřednictvím dotačního programu města.
3 S.1.1.3	Domov pro seniory / schválení varianty řešení zajištění této sociální služby pro občany Kopřivnice	PZ rozhodnutí o variantě ZM	2013	ORM	zahájeno	ZM rozhodlo o výstavbě DpS, v současné se zpracovává studie proveditelnosti srovnávací varianty řešení výstavby a provozu.
4 S.1.2.1	Domov pro seniory / realizace opatření dle schválené varianty řešení	E PZ provoz soc. služby	2014	ORM	nezahájeno	O variantě řešení výstavby a provozu DpS bude rozhodovat ZM v roce 2014.
5 S.1.1.5	Komunitní plán sociálních služeb (KPSS) / dokončení dotačního projektu	monitorovací zprávy	2013	OSV	splněno	Projekt byl dokončen. Všechny plánované aktivity byly realizovány.
6 S.1.1.5	Komunitní plán sociálních služeb (KPSS) / realizace plánovaných aktivit	PZ výstupy dle KPSS	2013 / 2014	OSV	zahájeno	Byly realizovány dílčí aktivity KPSS - ocenění pracovníků v soc.oblasti, propagace soc. služeb, rozšíření provozu obč.poradny
7 S.1.1.6	Propagace sociálních služeb / kampaň Den země + Den sociálních služeb	realizace kampaně	2013 / 2014	OSV	splněno	Všechny plánované aktivity pro rok 2013 byly realizovány, pro rok 2014 se připravují nové.
8 S.1.1.7	Bezbariérové úpravy budov s občanskou vybaveností / výměna výtahů DPS č.p. 320	PZ realizace akce	2013	OMM	splněno	Akce dokončena. Městu se na její realizaci podařilo získat dotaci z MMR.
9 S.1.3.4	Denní centrum pro lidi bez domova / přemístění do AD a podpora provozu denního centra	PZ poskytování služeb	2013	OSV	splněno	Akce dokončena. Denní centrum Racek je plně v provozu v nové části AD.
10 S.2.1.2	KAMERY do ZŠ / příprava "pilotního" projektu - výběr ZŠ, umístění kamer, vyřešení legislativního rámce	usnesení RM	2013 / 2014	OŠK	nezahájeno	Akce nebyla zařazena do rozpočtu města. Nebyl identifikován vhodný dotační program určený k tomuto účelu.
11 S.2.1.3	Volnočasový klub pro děti a mládež / zajištění provozu v rámci využití KDK	PZ zajištění provozu	2013	OŠK	zahájeno	Jsou vedena jednání o zřízení klubu v prostorách na sídlišti Sever.
12 S.2.1.4	Požární ochrana / úprava hasičských zbrojnic v Lubině	realizace akce	2014	ORM	nezahájeno	Akce bude realizována v případě, že bude zařazena do rozpočtu 2014.
13 S.2.2.2	Výchova k bezpečí / přednášky pro žáky ZŠ, činnost kurátora	realizace přednášek	2013	OSV	splněno	Proběhly přednášky z oblasti SPOD a pro 6. třídy ZŠ před. k protidrogové prevenci, do škol bylo distribuováno DVD - Bludný kruh financí
14 S.2.3.1	Intenzivní terénní práce / zhodnocení práce terénního pracovníka za rok	roční zpráva	průběžně	OSV	splněno	Terénní práce je zajišťována RENARKONEM a město na ni přispívá prostřednictvím svého dotačního programu.

Shrnutí: V prioritní oblasti sociální zázemí bylo **splněno 67 %** akcí plánovaných pro rok 2013 a dalších **25 % akcí bylo zahájeno**. Mimo jiné pokračovaly přípravy projektu výstavby domova pro seniory, byla realizována modernizace výtahů v domě č.p. 320, ve kterém jsou malometrážní byty pro seniory, byl dopracován a schválen nový Komunitní plán sociálních služeb.

Akční plán pro rok 2013- 2014

I. Image města

Kód SP	Akce	Indikátor	Termín plnění	Odpovědnost	Stav	Komentář
1	I.1.1.1 CENTRUM / veřejná diskuse k celému projektu, získání podpory veřejnosti v rámci aktual. strat. plánu	veřejná projednání	2013 / 2014	ORM	zahájeno	Město podpořilo veřejnou prezentaci prací mladých architektů, kteří se zabývali prostorem centra města.
2	I.1.1.2 CENTRUM / aktualizace zadání projektu	projednání v ZM	2014	ORM	nezahájeno	Diskuse k centrální zóně města bude zahájena po provedení aktualizace strategického plánu.
3	I.1.1.3 Sad E. Beneše / realizace projektu "brownfield" v případě získání dotace - spoluúčast	PZ předání díla	2013 / 2014	ORM	zahájeno	Dotace na realizaci projektu byla schválena, bylo však nutno upravit rozsah projektu, jeho realizace proběhne v roce 2014.
4	I.1.1.3 Sad E. Beneše / likvidace plotu	PZ předání díla	2013	ORM	splněno	Akce dokončena.
5	I.1.1.3 Sad E. Beneše / budova závodního klubu - definice zadání, hledání partnera, asanační plán a zachovná údržba	usnesení RM	2013	OMM	zahájeno	ZM jmenovalo prac.skup.V současné době je hledán partner(nájemce a provozovatel), který by se na rekonstr. objektu podílel.
6	I.1.1.5 KDK / návrh etap postupné revitalizace - definice zadání, rozsahu, cílového stavu funkčního využití	E usnesení RM	2013	OŠK	nezahájeno	
7	I.1.1.5 KDK / rekonstrukce vestibulu	E zpracovaná PD	2013 / 2014	OŠK	nezahájeno	S ohledem na fin. náročnost následné real., aktuální nemožnost externího spolufin. a další investiční akce nebyla proj. příprava zahájena.
8	I.1.1.6 RADNICE / vyhod. stavu a rozhodnutí o využití volných kapacit v budově Radnice (kinosál, kan. prostory ...)	usnesení RM	2013	tajemník	zahájeno	Bude pokračovat práce neformální pracovní skupiny pro budovu, která definuje potřeby z hlediska údržby a investic do objektu.
9	I.1.1.6 RADNICE / zajištění financování a příprava realizace energeticky úsporných opatření	E návrh financování	2013	OMM	splněno	Nebyly vyčleněny finance na investiční akci, byla zahájena realizace opatření formou EPC (IRC regulace, změna osvětlení)
10	I.1.1.6 RADNICE / výměna trafostanice	E předání díla	2013	OMM	zahájeno	Byla zpracována PD a vydáno stavební povolení. Akce bude realizována v roce 2014.
11	I.1.2.3 Městský mobiliář / stanovení pravidel pro jednotný přístup v rámci osazování městského mobiliáře	usnesení RM	2013	ORM	zahájeno	K problematice se scházela se neformální pracovní skupina, prvním krokem je zakotvení odpovědnosti za problematiku do aktualizace organizačního řádu.
12	I.1.2.4 SEVER / příprava žádosti o dotaci na MMR na RC 2 a 3 - Trappes	PZ zpracovaná PD	2013	ORM	zahájeno	Probíhá projektová příprava. S ohledem na úpravy projektu bude dokončena tak, aby žádost o dotaci byla podána v závěru roku 2014.
13	I.1.2.4 IPRM / realizace II. projektu revitalizace VP	PZ předání díla	2012 / 2014	ORM	splněno	Akce dokončena, byly obnoveny vybrané chodníky, okolí ZŠ Alšova vč. hřiště, prostor za bývalou MŠ Máchova a vybudováno víceúčelové hřiště.
14	I.1.2.4 IPRM / dopracování PD - SO 09 chodníky	PZ zpracovaná PD	2013	ORM	splněno	Akce dokončena. Je připravována žádost o dotaci na realizaci akce v rámci IPRM.
15	I.2.1.1 Marketing / realizace dílčích opatření marketingové strategie města (např. Koprtech)	vyhodnocení plnění	2013	OVV	splněno	Bylo vyhodnoceno plnění mark. strategie, byly realizovány akce k propagaci města a jeho partnerů.
16	I.2.1.4 Benchmarking / zajištění aktualizace dat v rámci Benchmarkingové iniciativy	aktualizace dat	2013 / 2014	OPE	splněno	Byly doplněny potřebné indikátory, s výsledky benchmarkingu bylo seznámeno vedení města a vedoucí odborů.
17	I.2.2.2 Systematická spolupráce města s médií / tiskové konference, tiskové zprávy, ...	počet tiskových konferencí	2013 / 2014	OVV	splněno	Město vydávalo pravidelně tiskové zprávy, zástupci médií byli zváni na jednotlivé městské akce apod.
18	I.2.2.4 IOS / příprava zásad rozvoje informačních a navig. sys. ve městě vč. návrhu realizace a financování	schválené zásady	2013	tajemník	zahájeno	Proběhla jednání zainteresovaných subjektů, řešení problematiky bylo předáno na ORM.
19	I.2.2.5 Průzkum / realizace pravidelného sociologického průzkumu	zpráva	2014	OVV	nezahájeno	Průzkum bude realizován v roce 2014 v rámci projektu aktualizace strategického plánu.
20	I.2.2.6 PZM a MA21 / realizace Akčního plánu zlepšování ZM	min.obhaj. kat. B	2013 / 2014	ORM	splněno	Město obhájilo kategorii B***. Město patří mezi 3 nejpokročilejší města v MA 21 v rámci NSZM.
21	I.3.1.2 Vila Dr. Bönische / příprava řešení stavu a využití objektu (např. příprava podmínek prodeje objektu,...)	usnesení ZM	2013	OMM	zahájeno	Byl schválen prodej objektu, v současné době hledá město kupce.
22	I.3.1.3 Rekonstrukce KD Vičovice / rekonstrukce soc. zařízení a vstupu	předání díla	2013	OMM	splněno	Akce byla v souladu s plánem dokončena.
23	I.3.2.1 Sportoviště pod ČK - Zimní stadion / oprava střech tělocvičen a kanceláří	E PZ předání díla	2013	OMM	splněno	Akce byla v souladu s plánem dokončena.

E = Energetický plán města

PZ = Plán zdraví a kvality života Kopřivnice

Kód SP	Akce	Indikátor	Termín plnění	Odpovědnost	Stav	Komentář	
24	1.3.2.1 Sportoviště pod ČK - Zimní stadion / výměna kompresorovny a kogenerační jednotka (EPC)	E	realizace akce	2013	OMM	zahájeno	S ohledem na přípravu projektu rekonstrukce chlazení byl původní projekt upraven a v rámci EPC budou řešena dílčí opatření.
25	1.3.2.1 Sportoviště pod ČK / Krytý bazén - rozšíření nabídky služeb (moder. sprch, saun. kabina, vířivka,...)	PZ	schválené zadání RM	2013	ORM	zahájeno	Byla připravena PD a zahájeno VŘ na dodavatele, které bylo zrušeno. Projekt v upraveném rozsahu je připravován k realizaci v roce 2014.
26	1.3.2.1 Sportoviště pod ČK / Krytý bazén - rekonstrukce kotelny (EPC)	E	realizace akce	2013	OMM	zahájeno	Byla uzavřena smlouva s ESCO firmou, která bude opatření v roce 2014 realizovat.
27	1.3.2.4 Hřiště Lubina / střídačky, časomíra		předání díla	2013	OMM	splněno	Akce byla v souladu s plánem dokončena.
28	1.3.2.4 Hřiště Lubina / příprava žádosti o příspěvek z nadace ČEZ pro realizaci dětského hřiště		podaná žádost	2013	ORM	splněno	Žádost byla podána. Nebyla však podpořena.
29	1.3.2.4 Dětská hřiště a sportoviště / úprava stávajícího hřiště v Sadu E. Beneše	PZ	revitalizace hřiště	2013	OMM	splněno	Hrací plocha pro děti v sadu E. Beneše byla doplněna o kolotoč a pružinová houpadla.
30	1.3.2.4 Dětská hřiště a sportoviště / hřiště v Sadu E.B. projektová příprava v návaznosti na revitalizaci brownfieldu	PZ	příprava PD	2014	ORM	nezahájeno	V roce 2014 bude probíhat demolice vybraných objektů v sadu a bude připraveno území pro další rozvoj.
31	1.3.2.4 Dětská hřiště a sportoviště / postupná obnova a výstavba dětských hřišť a sportovišť	PZ	1 hřiště ročně	2013 / 2014	ORM	splněno	Kromě dokončení zahrad u MŠ Krátká a Francouzská bylo otevřeno víceúčelové hřiště na sídlišti JIH a školní hřiště u ZŠ Alšova.
32	1.3.3.1 Zpracování výhledu zajištění kultury		projednaný návrh	2013	OŠK	zahájeno	Zpracovaná analytická část, dokument bude dokončen po schválení aktualizace SP, která může mít vliv na některá opatření v kultuře.
33	1.3.3.1 Dotační program na podporu kultury a osvětové činnosti	PZ	vyhlášené programy	2013 / 2014	OŠK	splněno	Finanční prostředky byly rozděleny v souladu s podmínkami dotačního programu
34	1.3.3.2 Rozvoj tradičních sportovních akcí / org. výročního běhu rodným krajem E. Zátopka vč. dopr. akcí		realizace akcí	2013 / 2014	OŠK	splněno	Všechny plánované akce se uskutečnily
35	1.3.3.2 a 3 Dotační program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu	PZ	vyhlášené programy	2013 / 2014	OŠK	splněno	Finanční prostředky byly rozděleny v souladu s podmínkami dotačního programu
36	1.4.1.1 Lašská brána Beskyd / pokračování v aktivitách v rámci projektu prostřednictvím KDK, p.o.		plnění ročních plánů realizace	2013 / 2014	OŠK	splněno	Aktivity Lašské brány jsou realizovány manažerem turistické destinace, který byl zařazen pod p.o. KDK.
37	1.4.2.1 Využití polygonu pro aktivity v cestovním ruchu / organizace vlastních a podpora partnerských akcí		realizace akcí	2013 / 2014	OŠK	splněno	V partnerství více subjektů byly na polygonu realizovány Kopřivnické dny techniky.
38	1.4.2.1-5 Cestovní ruch / Podpora spolupráce a iniciace partnerství s jinými subjekty		min. 2 partnerství	2013 / 2014	OŠK	splněno	Partnerství s Agenturou Beskydy-Valašsko, Destinačním managementem Beskydy-Valašsko, spolupráce s Valašským královstvím s.r.o.
39	1.4.2.7 Využití městského parku s odkazem Z. Buriana / tématické zaměření akcí a vybavení v parku		realizace akcí	2013 / 2014	OŠK	splněno	V sadu byly realizovány akce, nebyly však tématicky zaměřené k ZB, start Pochoodu všech generací, TEEN-IN discgolf, Guerilla knitting, Den země, ..)
40	1.4.3.2 Fojtství / rozšíření aktivit, zatraktivnění expozic v souladu s výhledem muzejnictví		realizace akcí	2013 / 2014	OŠK	zahájeno	Pro rok 2014 je připravován projekt v rámci IPRM na obnovu prostranství v areálu Fojtství, která umožní realizaci doprovodných aktivit.

Shrnutí: Plánované akce pro rok 2013 byly v této prioritní oblasti **splněny z 57 %** a z **38 % byly zahájeny**. Mezi investičně významné akce z této oblasti patří dokončení II. etapy revitalizace veřejného prostranství na sídlišti JIH, které bylo podpořeno 85 % dotací z IOP. Na podzim roku 2013 se městu podařilo po sedmé obhájit kategorii B v realizaci MA 21, v průběhu roku byly realizovány tradiční i nové sportovní a kulturní akce.

Akční plán pro rok 2013 - 2014

D: Doprava, infrastruktura, životní prostředí

Kód SP	Akce	Indikátor	Termín plnění	Odpovědnost	Stav	Komentář
1 D.1.2.1	Organizace parkování ve městě / realizace koncepce parkování v centru města	realizace koncepce	2013	ORM	splněno	Došlo ke změně původního řešení (placené parkování), byly vyčleněny zóny s omezenou dobou parkování (parkoviště MÚ, Albert, ..)
2 D.1.2.1	Parkoviště u KD Vičovice / realizace	předání díla	2014	ORM	nezahájeno	Finance na projektovou přípravu a realizaci budou požadovány v rámci přípravy rozpočtu 2014
3 D.1.2.1	Parkování sídliště Sever / příprava PD pro RC 2 a 3 - parkování Trappes	PZ zpracovaná PD	2013	ORM	zahájeno	Zahájena projektová příprava, připravuje se opětovně veřejné připomínkové řešení
4 D.1.2.1	Parkování / intenzifikace parkovacích ploch v Kopřivnici - zjednosměrnění ulic	PZ realizace akce	2013	ORM	zahájeno	Je připravena koncepce, připravuje se její zveřejnění a veřejné projednání
5 D.1.2.1	Parkování / ul. Kadláčkova - vnitroblok s výjezdem na ul. ČS armády	PZ zpracovaná PD	2013	ORM	zahájeno	Připravuje se VŘ na dodavatele PD
6 D.1.2.2	Ul. Štramberská / aktualizace zadání další etapy, jednání se správci sítí	PZ usnesení RM	2013	ORM	nezahájeno	S ohledem na realizaci investičních akcí naplánovaných v rozpočtu města nebyla tato akce v roce 2013 řešena.
7 D.1.2.3	Ul. Panská / úprava křižovatky "u Dury"	předání díla	2013	ORM	zahájeno	Realizace akce je zařazena do R 2014, jsou vedena jednání o souhlasu Tatry s realizací.
8 D.1.2.5	Doplnění místních komunikací / oprava mostu a dok. křižovatky sil II/480 - ul. Dělnická	předání díla	2013 / 2014	ORM	splněno	V 12/2013 byl rekonstruovaný most včetně nové sjezdové rampy uveden do provozu.
9 D.1.2.5	Lokalita Pinkavka / příprava řešení přístupové komunikace	PZ usnesení RM	2013	ORM	splněno	V roce 2013 byla rekonstruována příjezdová komunikace do lokality - nový asfaltový povrch
10 D.1.2.6	Mostek M1 - Mniší / realizace opravy dle zpracované PD	předání díla	2014	OMM	nezahájeno	Realizace akce je závislá na vyčlenění potřebných financí v rozpočtu města
11 D.1.2.9	Obchvat Vičovic I/58 / pokračování v jednáních s ŘSD	zápis z jednání	2013 / 2014	ORM	nezahájeno	V roce 2013 se neuskutečnila zvláštní jednání k této problematice.
12 D.2.1.1	Chodník v Mniší / dokončení PD	zpracovaná PD	2013	ORM	splněno	PD je připravena, pro 1. etapu projektu byla přislíbena dotace ze SFDI, pro další etapu je připravována žádost o dotaci z ROP.
13 D.2.1.1	Chodník v Mniší / zahájení realizace I. etapy	předání díla	2013 / 2014	ORM	zahájeno	Byla přislíbena dotace na I. etapu projektu, je však nutno zajistit převod alokovaných financí do roku 2014; je ukončeno VŘ na dodavatele.
14 D.2.1.1	Chodník v Mniší / výkupy pozemků pro realizaci akce	připravené území	2013 / 2014	ORM	zahájeno	Pro realizaci projektu byly uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích, výkupy budou provedeny po ukončení stavby
15 D.2.1.1	Chodník ul. Hřbitovní / studie	zpracovaná PD	2013	ORM	zahájeno	Finance na realizaci akce byly přesunuty do rozpočtu 2014
16 D.2.1.3	Bezb.město II.trasa / projektová dokumentace	zpracovaná PD	2014	ORM	nezahájeno	Finance na projektovou přípravu budou požadovány v rámci přípravy rozpočtu 2014
17 D.2.1.3	Bezb.město I. trasa - přechod u České spořitelny - světelná signalizace	předání díla	2013	ORM	zahájeno	Realizace akce je zařazena do R 2014, snahou města je zajistit dotaci z ROP na realizaci akce
18 D.2.1.3	Bezb.město I. trasa - úprava vstupů a bezbariérových přístupů do veř.objektů v trase - PD	zpracovaná PD	2013 / 2014	ORM	nezahájeno	Finance na projektovou přípravu budou požadovány v rámci přípravy rozpočtu 2014
19 D.2.1.4	Cyklostezky I.etapa "Kopřivnička" / realizace projektu	předání díla	2013	ORM	splněno	Akce byla dokončena, proběhlo slavnostní zahájení provozu.
20 D.2.1.4	Cyklostezka "z Poodří do Beskyd" úsek Lubina - Vičovice / realizace projektu	předání díla	2013	ORM	splněno	Akce byla dokončena, proběhlo slavnostní zahájení provozu.
21 D.2.1.4	Cyklostezka "Ke křížku" / podání žádosti o dotaci	žádost o dotaci	2013	ORM	splněno	Žádost o dotaci byla podána a dotace na realizaci projektu byla schválena.
22 D.2.1.4	Cyklostezka "Ke křížku" / realizace projektu v případě získání dotace - spoluúčast	předání díla	2014	ORM	zahájeno	Realizace projektu je plánována v roce 2014, realizace bude zahájena po ukončení jednání s Tatrou ve věci křižovatky u Dury.
23 D.2.1.4	Podpora cyklo dopravy / realizace motivační kampaně, mobiliář (v případě získání dotace)	realizace akce	2013	ORM	splněno	Dotace z MSK na projekt "Deset let s Vámi" byla schválena a bylo realizováno mnoho dílčích aktivit, mj. natočen videoklip o správném chování na kole.

E = Energetický plán města

PZ = Plán zdraví a kvality života Kopřivnice

Kód SP	Akce	Indikátor	Termín plnění	Odpovědnost	Stav	Komentář	
24	D.3.1.1 Odkanalizování MČ Lubina / dokončení projektu, realizace soukromých přípojek		předání díla	2013	ORM	splněno	Akce byla dokončena včetně soukromých přípojek vlastníků objektů, kterým byla vyplacena podpora z rozpočtu města.
25	D.3.1.3 Odkanalizování ul. Záhumenní / rozhodnutí o řešení ve vztahu ke zpracované studii		usnesení RM	2013	ORM	nezahájeno	S ohledem na finanční náročnost realizace akce nebyl radě města předložen materiál řešící danou lokalitu.
26	D.3.1.3 Odkanalizování, chodník ul. Janáčkova / příprava PD a výkup pozemků		přípravená PD	2013	ORM	zahájeno	Finance na projektovou přípravu byly převedeny do roku 2014.
27	D.3.2.1 TEPLO / realizace projektu společností Teplo s.r.o.	E	předání díla	2013 / 2014	OMM	zahájeno	V roce 2013 byly zahájeny stavební práce na realizaci projektu.
28	D.3.2.1 TEPLO / zpracování návrhu (konceptu) budoucího využití výměňkových stanic		usnesení RM	2013	OMM	zahájeno	Na základě průzk.mezí přisp.a obch.spol.města nevznikly konkrétní záměry využití. Z důvodu posunu real. proj. byla příprava návrhu odložena na r. 2014.
29	D.3.3.1 Metropolitní síť / připojení rozvodů v rámci projektu Teplo (realizováno KTK)		realizace akce	2013 / 2014	ORM	zahájeno	Kabelové rozvody pro metropolitní síť jsou příkládány v rámci nových rozvodů tepla.
30	D.3.3.1 Bezdrátový rozhlas / bude realizováno v rámci dotačního projektu Varovný a monitorovací systém		realizace akce	2013 / 2014	OŽP	zahájeno	V roce 2013 byly projednány s poskytovatelem dotace změny v projektu a bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele, které probíhá.
31	D.3.4.2 BYDLENÍ / Analýza potřeb a výhled rozvoje bydlení	PZ	usnesení RM	2013	ORM	zahájeno	
32	D.3.4.2 BYDLENÍ / ul.Západní - spolufinancování infrastruktury v případě dokončení výstavby v území	PZ	rozpočet	2014	ORM	nezahájeno	Finance na realizaci budou požadovány v rámci přípravy rozpočtu 2014
33	D.3.4.2 BYDLENÍ / Kopřivnice Západ - realizace dešťové kanalizace I.etapa (v rámci projektu POSEZ)	PZ	předání díla	2013 / 2014	ORM	zahájeno	I. etapa kanalizace zajišťující odvodnění skládky kalů byla dokončena. V roce 2014 budou obnoveny propustky na navazující vodoteči.
34	D.3.4.2 BYDLENÍ / nabídka pozemků developerům - lokalita Kopřivnice Západ, Dolní Roličky	PZ	zpracovaná nabídka	2013 / 2014	ORM	nezahájeno	lokality nejsou z hlediska technické infrastruktury připraveny ke zpracování nabídky (výkup pozemků ČD - probíhá jednání)
35	D.3.4.3 Modernizace bytového fondu - IPRM / realizace obnovy BD v majetku města - střechy	E PZ	předání díla	2013	OMM	zahájeno	V roce 2013 bylo zrušeno VŘ na dodavatele akce a opakované VŘ stále probíhá.
36	D.3.4.3 Modernizace bytového fondu - IPRM / realizace obnovy BD v majetku města - infrastruktura	E PZ	předání díla	2013 / 2014	OMM	zahájeno	Probíhá VŘ na dodavatele stavby.
37	D.3.4.3 Modernizace bytového fondu / revitalizace čp. 988-989 - fasáda, balkóny	E PZ	předání díla	2013	OMM	nezahájeno	Z důvodu připravovaného prodeje objektu nebyla akce realizována.
38	D.3.5.1 Protipovodňová opatření / Odvedení potoka od Husovy lípy do Kopřivničky - realizace		předání díla	2014	ORM	nezahájeno	Finance na projektovou přípravu budou požadovány v rámci přípravy rozpočtu 2014
39	D.3.5.1 Protipovodňová opatření / Rek.mlýnského náhonu ve Vlčovicích - realizace		předání díla	2014	ORM	nezahájeno	Finance na projektovou přípravu budou požadovány v rámci přípravy rozpočtu 2014
40	D.3.5.1 Protipovodňová opatření / varovný a monitorovací systém - realizace projektu		předání díla	2013 / 2014	OŽP	zahájeno	Probíhá VŘ na dodavatele projektu. Předpoklad zahájení prací 4/2014.
41	D.4.1.1 LCHSEZ / monitoring lokalizovaných SEZ		provedení monitoringu	2013 / 2015	OŽP	zahájeno	Od roku 2012 se provádí monitoring, který bude ukončen 6/2015. Jsou prováděny pravidelné odběry vzorků, vyhodnocení je předkládáno RM.
42	D.4.1.4 POSEZ / realizace projektu sanace skládky kalů		předání díla	2013 / 2015	ORM	zahájeno	Sanace skládky formou enkapsulace byla dokončena, v dalších letech bude projekt stavebně dokončen a bude provedeno kontrolní měření.
43	D.4.2.1 EVVO / účelový příspěvek školám města		rozpočet	2013 / 2014	OŠK	splněno	Akce dokončena, příspěvek byl vyplacen.
44	D.4.2.1 EVVO / kampaň: Den Země		realizace kampaně	2013 / 2014	ORM	splněno	Veškeré plánované akce v rámci kampaně proběhly.
45	D.4.2.1 EVVO / kampaň: Den bez aut		realizace kampaně	2013 / 2014	ORM	splněno	Veškeré plánované akce v rámci kampaně proběhly.
46	D.4.2.1 EVVO / Aktualizace Lašské naučné stezky, v případě získání dotace		realizace akce	2013	OŽP	splněno	Dotace z MSK byla schválena, naučná stezka byla ve spolupráci s veřejností obnovena.
47	D.4.2.2 IS o stavu a kvalitě ŽP / Průběžná aktualizace dat o stavu a kvalitě ovzduší - infopanel o kvalitě ovzduší		aktualizovaná data	průběžně	OŽP	splněno	Je prováděna průběžná aktualizace webu města, u vchodu do MÚ je infopanel o kvalitě ovzduší v Kopřivnici
48	D.4.2.2 IS o stavu a kvalitě ŽP / Ekologická stopa - nástroj udržitelnosti města Kopřivnice		zpracovaný výpočet	2013	OŽP	splněno	Byl proveden nový výpočet ekologické stopy města. Hodnota indikátoru se oproti minulému šetření snížila.

E = Energetický plán města

PZ = Plán zdraví a kvality života Kopřivnice

	Kód SP	Akce		Indikátor	Termín plnění	Odpovědnost	Stav	Komentář
49	D.4.3.3	Snížení znečištění ovzduší / Osvětová kampaň		realizace kampaně	2013 / 2014	OŽP	splněno	Proběhla letáková akce - Zásady správného topení, byl uveřejněn článek v KN ke "kotlíkové" dotaci a Nové Zelené úsporám.
50	D.4.3.4	Systém sběru a nakládání s odpady / realizace koncepce a příprava projektů	PZ	zpracované projekty	2013 / 2014	OŽP	zahájeno	Schválená koncepce je postupně realizována dílčími projekty a akcemi.
51	D.4.3.4	Systém sběru a nakládání s odpady / výstavba zpevněných stání pro kontejnery a bourání starých přístřešků	PZ	předání díla	2014	OŽP	splněno	Došlo k vybourání obvodových zdí na ul. Polní a rozšíření zpevněné plochy na ul. Zd. Buriana.
52	D.4.3.4	Systém sběru a nakládání s odpady / utěsnění plochy v kompostárně Točna Příbor		předání díla	2013	OŽP	splněno	Byla opravena fermentační plocha, nadále probíhá monitoring znečištění podzemních vod kompostárny.
53	D.4.3.4	Systém sběru a nakládání s odpady / zřízení 2. sběrného dvoru - rozhodnutí o projektu		usnesení orgánů města	2014	OŽP	nezahájeno	Další postup v řešení problematiky bude navržen po dokončení VŘ na poskytovatele komunálních služeb.
54	D.4.3.4	Systém sběru a nakládání s odpady / pořízení a distribuce kompostérů, za předpokladu získání dotace	PZ	realizace akce	2014 / 2015	OŽP	splněno	Díky dotaci z OPŽP byly nakoupeny a do domácností distribuovány další kompostéry (420 ks o objemu 600 l).
55	D.4.4.1/2	"Korej" Náhrada problematických druhů zeleně / realizace projektu	PZ	předání díla	2013 / 2014	OŽP	splněno	Projekt podpořený dotací z OPŽP byl dokončen.
56	D.4.4.2	Revitalizace zeleně / realizace dílčích opatření v rámci investičních projektů (IPRM, Korej...)	PZ	realizace opatření	2013 / 2014	OŽP	splněno	Zeleň byla v rámci dalších projektů obnovy veřejného prostranství revitalizována (IPRM, Korej, atrium ZŠ Horákové
57	D.4.4.4	Výstavba a obnova alejí a větrolamů / podání informace RM o stavu aktivity	PZ	usnesení RM	2013	OŽP	splněno	Projednáno na 75. schůzi RM 11.6.2013, usn. č. 2384
58	D.4.4.5	Ochrana vzácných dřevin dle schváleného systému / označení významných stromů v terénu		realizace opatření	2013 / 2014	OŽP	nezahájeno	Na realizaci akce nebyly schváleny finanční prostředky v rozpočtu města.

Shrnutí: Akce plánované pro rok 2013 v této obsahově nejrozsáhlejší prioritní oblasti byly **splněny ze 43 %** a ze **43 % byly zahájeny**. Investičně a organizačně nejnáročnější akcí bylo dokončení projektu odkanalizování MČ Lubina, dále byly dokončeny cyklostezky podél toku Kopřivničky a z Lubiny do Vlčovic, byla provedena enkapsulace skládky kalů, došlo k obnově zeleně na mnoha místech Kopřivnice.
